

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 경상남도에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
경상남도 대표도서관 건립	31,644	12,536	19,108	-	2017	2016	100
경상남도 남명학사 건립사업	34,705	745	13,551	10,245	2018	2015	100
마산의료원 장례식장 신축	9,418	326	3,660	5,432	2018	2014	42
소사~녹산간 도로개설사업	293,866	273,980	16,893	2,993	2018	2004	98%
석동~소사간 도로개설사업	293,955	190,166	16,522	87,267	2019	2007	65%
웅동지구 진입도로 개설사업	24,356	6,110	8,100	10,146	2019	2011	5%
갈사만진입도로 (4호선) 연결도로 개설사업	15,973	12,614	1,000	2,359	2018	2008	64%
대송산업단지 내부간선도로 개설사업	33,310	23,071	3,089	7,150	2018	2010	78%
활수산물 수출물류 거점센터 건립	5,000	-	80	4,920	2019	2017	-
악양~묵계간 도로 확포장	391,120	0	0	391,120	2024	2017	설계중
고성~동해2간 도로확포장	10,300	0	0	10,300	2024	2017	설계중
연산~장암간 도로확포장	7,112	0	0	7,112	2024	2017	설계중

10-1-1. 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	경상남도 대표도서관 건립	담당자	경남대표도서관 박정혜(☎254-4822)
-----	---------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도내 공공도서관 등을 총괄하는 컨트롤 타워 역할 수행
- 도민의 문화생활 증진 및 평생교육기관 역할 수행

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년
- 위 치 : 창원시 의창구 사림로 45번길 59(경남대표도서관)
- 규 모 : 대지면적 14,226㎡, 연면적 7,867㎡, 지하1층/지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 31,644백만원(공유재산 공시지가 환산액 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	31,644	12,536	19,108		
국 비	4,806		4,806		
도 비	23,838	12,536	11,302		
기 타	3,000		3,000		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 착공 : '16. 12.
- 대표도서관 조례 전부개정 및 명칭 확정 : '16. 12.
- 도서관 부호등록 완료(148308) : '16. 12.
- 공사 준공 : '17. 12.

□ 향후계획

- 대표도서관 개관 : '18. 2.

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	경상남도 남명학사 건립사업	담당자	교육지원담당관 한훈(2373)
-----	----------------	-----	------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 성장가능성이 풍부한 대학생에게 면학 여건 지원 강화로 애향심 고취 및 지역 인재 육성을 도모하고, 도립기숙사를 서울로 확대하여 균형있는 교육지원 도모 및 타 시도와의 형평성 유지

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018년
- 위 치 : 서울특별시 강남구 자곡동 632
- 규 모 : 지하1층 지상5층, 숙실 200실(2인 1실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,705백만원
 - 건축비 : 25,912백만원, 부지매입비8,793백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	25,912	745	13,551	10,245	
국 비					
시 도 비	25,912	745	13,551	10,245	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 대행사업비(건축비) 교부금(25,912백만원) = 집행액(24,541백만원) + 정산반환예정액(1,371백만원 정도)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100.0%)

- 2018. 02. 14 : 공사 준공

□ 향후계획

- 남명학사 서울관 운영 및 관리

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명	마산의료원 장례식장 신축	담당자	보건행정과 최상일(☎ 211-4953)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후화된 장례식장 신축을 통하여 차별화된 지역의 선진 장례문화를 선도
- 민간병원이 수행하지 못하는 포괄적 보건의료서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년
- 위 치 : 창원시 마산합포구 3.15대로 231
- 규 모 : 지하1층, 지상3층 (분향실 7실, 연면적: 4,509.57㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,418백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,418	326	3,660	5,432	
국 비	3,750	163	1,830	1,757	
시 도 비	3,750	163	1,830	1,757	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,918			1,918	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

- '15. 06. 12 : 장례식장 신축공사 위·수탁 협약 체결
- '16. 02. 12 : 장례식장 신축 설계용역 착수
- '16. 11. 20 : 보건복지부 기본설계 심의 완료
- '17. 02. 06 : 건축·교통·경관심의 승인
- '17. 08. 24 : 건축(변경)허가
- '17. 09. 21 : 공사착공

□ 향후계획

- '18. 10월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모 변경	연면적 4,092㎡	연면적 4,509.57㎡
총사업비 변경	7,500백만원 (국 3,750 도 3,750)	9,418백만원 (국 3,750 도 3,750 기타 1,918)

사업명	소사~녹산간 도로개설사업	담당자	경제정책과 서상혁(☎211-3454)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국도2호선 대체도로 기능으로 물류분산을 통한 지구개발 경쟁력 강화
- 구역내 기반시설인 도로사업의 조기 준공으로 투자유치 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2004년 ~ 2018년
- 위 치 : 창원시 진해구 소사동 ~ 부산시 강서구 녹산동
- 규 모 : 도로개설 L=7.41km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 293,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	293,866	273,980	16,893	2,993	-
국 비	146,933	134,940	9,000	2,993	-
시 도 비	146,933	139,040	7,893	-	-

□ 추진상황(공정률 98%)

- '06. 2월 : 실시설계 완료
- '06. 5월 : 공사 착공
- '17. 1월 : 10차분 공사 착공

□ 향후계획

- '18. 1월 : 본선 구간 도로 개통(진해IC~녹산교차로)
- '18. 5월 : 전체 사업 완료

사업명	석동~소사간 도로개설사업	담당자	경제정책과 서상혁(☎211-3454)
-----	---------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국도2호선 대체도로 기능으로 물류분산을 통한 지구개발 경쟁력 강화
- 구역내 기반시설인 도로사업의 조기 준공으로 투자유치 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2007년 ~ 2019년
- 위 치 : 창원시 진해구 석동 ~ 소사동
- 규 모 : 도로개설 L=7.03km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 293,955백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	293,955	190,166	16,522	43,618	43,649
국 비	146,978	95,083	8,261	21,809	21,825
시 도 비	146,977	95,083	8,261	21,809	21,824

□ 추진상황(공정률 65%)

- '09. 9월 : 실시계획 승인
- '09. 11월 : 공사 착공
- '17. 3월 : 9차분 공사 착공

□ 향후계획

- '18. 3월 : 10차분 공사 착공
- '19. 12월 : 전체 사업 완료

사업명	웅동지구 진입도로 개설사업	담당자	경제정책과 서상혁(☎211-3454)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 경제자유구역내 입지기능 연계촉진을 위한 지역교통망 확충
- 웅동, 웅천·남산지구 접근성 확보 및 개발 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2019년
- 위 치 : 창원시 진해구 제덕동
- 규 모 : 도로개설 L=0.7km, B=35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,356백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	24,356	6,110	8,100	3,477	6,669
국 비	12,003	1,000	4,050	3,477	3,476
시 도 비	12,353	5,110	4,050	-	3,193

□ 추진상황(공정률 5%)

- '16. 1월 : 실시계획 승인
- '16. 6월 : 보상계획 공고
- '17. 3월 : 공사 착공

□ 향후계획

- '18. 8월 : 문화재조사 완료
- '19. 12월 : 전체 사업 완료

사업명	갈사만진입도로(4호선) 연결도로 개설사업	담당자	경제정책과 서상혁(☎211-3454)
-----	---------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 경제자유구역내 입지 기능 연계 촉진을 위한 지역 교통망 구축
- 국도19호선과 연계한 원활한 물류수송으로 투자유치 가속화

□ 사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2018년
- 위 치 : 하동군 금남면 대송산단 ~ 국도19호(사등교차로)
- 규 모 : 도로개설 L=0.52km, B=19.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,973백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,973	12,614	1,000	2,359	-
국 비	7,987	6,307	500	1,180	-
시 도 비	7,986	6,307	500	1,179	-

□ 추진상황(공정률 64%)

- '11. 6월 : 실시계획 승인
- '13. 12월 : 공사착공

□ 향후계획

- '18. 12월 : 전체 사업 완료

사업명	대송산업단지 내부간선도로 개설사업	담당자	경제정책과 서상혁(☎211-3454)
-----	-----------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대송산업단지 내부간선도로 구축을 통한 원활한 물류 수송
- 산업단지내 교통여건 조성으로 기업 투자유치 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2018년
- 위 치 : 하동군 금남면 대송산업단지내
- 규 모 : 도로개설 L=3.3km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,310백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	33,310	23,071	3,089	7,150	-
국 비	16,655	13,080	-	3,575	-
시 도 비	16,655	9,991	3,089	3,575	-

□ 추진상황(공정률 78%)

- '13. 10월 : 실시계획 완료
- '13. 12월 : 공사 착공

□ 향후계획

- '18. 12월 : 전체 사업 완료

사업명	활수산물 수출물류 거점센터 건립	담당자	해양수산물 주상철(☎211-3954)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 활어 해상 운송용 특수 컨테이너를 이용한 활어 수출 증가에 따른 전용 물류센터 건립 필요
- 활수산물 수출 물류비 절감 및 수출검역지원 등 물류체계 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년
- 위 치 : 창원시 진해구 남문동 1190-1 (부산항 신항 옹동 배후단지)
- 규 모 : 부지 2,106㎡, 연면적 1,648㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	-	80	2,460	2,460
국 비	2,500	-	76	1,194	1,230
도 비	2,500	-	4	1,266	1,230

□ 추진상황(추진단계 : 설계 완료)

- 물류센터 건립 업무 상호협력 협약 체결(도↔부산항만공사) : '16. 12월
- 공유재산 취득 의결(도의회) : '17. 4월
- 물류센터 건립 설계용역 완료 : '18. 5월

□ 향후계획

- 물류센터 건립 공사 계약 및 착공 : '18. 8월
- 물류센터 운영 위수탁 협약 : '18. 12월
- 물류센터 건립 공사 준공 : '19. 6월

사업명	악양~묵계간 도로 확포장	담당자	경상남도 도로과 도로계획 박대진(☎211-2965)
-----	---------------	-----	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 남해안 관광 클러스터, 지리산권 광역 관광개발, 청학동 전통관광 마을 등 내륙과 연안을 연계하는 지리산권 관광순환도로 연결
- 함양, 산청, 하동, 남해 등 지역연계와 도로이용객 및 지역민에게 통행거리 및 시간 감소로 편익 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 1.(6년)
- 위 치 : 하동군 악양면 등촌리 일원
- 규 모 : L=7.0km, B=9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	39,120			1,500	37,620
국 비					
시 도 비	39,120			1,500	37,620
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황

- '17. 9 : 지방재정 투자심사 반영
- '18. 1 ~ 9 : 실시설계 용역


□ 향후계획

- '18. 10 : 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '18. 11 : 보상절차 착수
- '19. 1 : 공사 발주
- '19. 1 ~ '24. 1 : 공사착공 및 준공


□ 사업변경 내역

- 해당없음

☐ 위치도 및 현장사진(조감도)

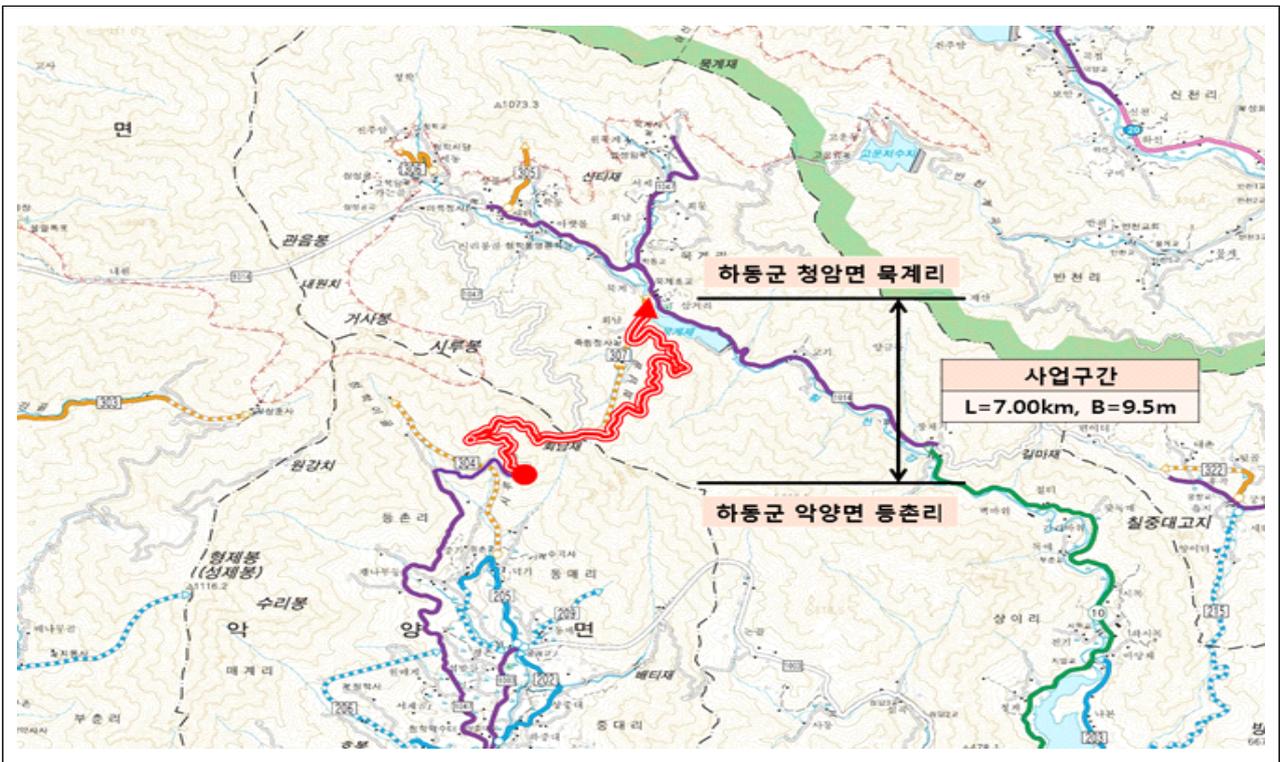

위 치	경상남도 하동군 악양면 등촌리 일원
-----	---------------------

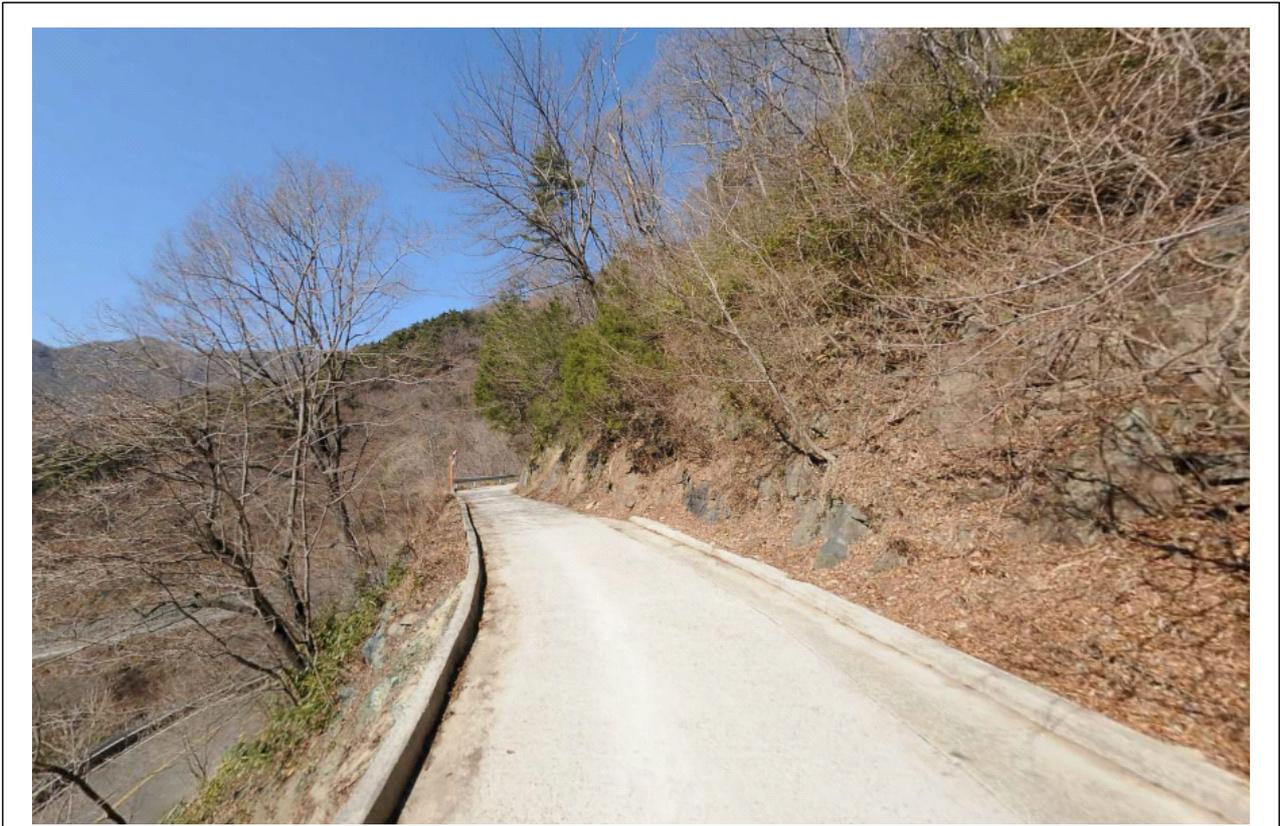

사진설명	악양~목계간 도로 확·포장사업 현장사진
------	-----------------------

사업명	고성~동해2간 도로 확포장	담당자	경상남도 도로과 도로계획 노영주(☎211-2968)
-----	----------------	-----	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 산업단지(농공, 일반) 물동량의 원활한 수송으로 물류비용 절감 및 지역 경제 활성화
- 원활한 교통소통 및 지역개발 촉진을 위한 차로 확장 계획 반영

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 1.(6년)
- 위 치 : 고성군 고성읍 송학리 ~ 동해면 외곡리
- 규 모 : L=2.0km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,300			500	9,800
국 비					
시 도 비	10,300			500	9,800
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황

- '17. 9 : 지방재정 투자심사 반영
- '18. 1 ~ 9 : 실시설계 용역

□ 향후계획

- '18. 10 : 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '18. 11 : 보상절차 착수
- '19. 1 : 공사 발주
- '19. 1 ~ '24. 1 : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

- 해당없음

☐ 위치도 및 현장사진(조감도)



위 치	경상남도 고성군 고성읍 송하리 일원
-----	---------------------



사진설명	고성~동해(2) 도로 확·포장사업 현장사진
------	-------------------------

사업명	연산~장암간 도로 확포장	담당자	경상남도 도로과 도로계획 노영주(☎211-2968)
-----	---------------	-----	---------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로망확충으로 지역균형발전 도모
- 원활한 교통소통 및 지역개발 촉진을 위한 차로 확장 계획 반영

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 1.(6년)
- 위 치 : 함안군 대산면 장암리 일원
- 규 모 : L=2.0km, B=9.5m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,112			500	6,612
국 비					
시 도 비	7,112			500	6,612
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황

- '17. 9 : 지방재정 투자심사 반영
- '18. 1 ~ 9 : 실시설계 용역

□ 향후계획

- '18. 10 : 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '18. 11 : 보상절차 착수
- '19. 1 : 공사 발주
- '19. 1 ~ '24. 1 : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

- 해당없음

☐ 위치도 및 현장사진(조감도)



위 치	경상남도 합안군 대산면 장암리 일원
-----	---------------------



사진설명	연산~장암간 도로 확·포장사업 현장사진
------	-----------------------
